



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM
Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos


Mayo 2023

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes




Avance total de los Proyectos

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Mayo 2023 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.

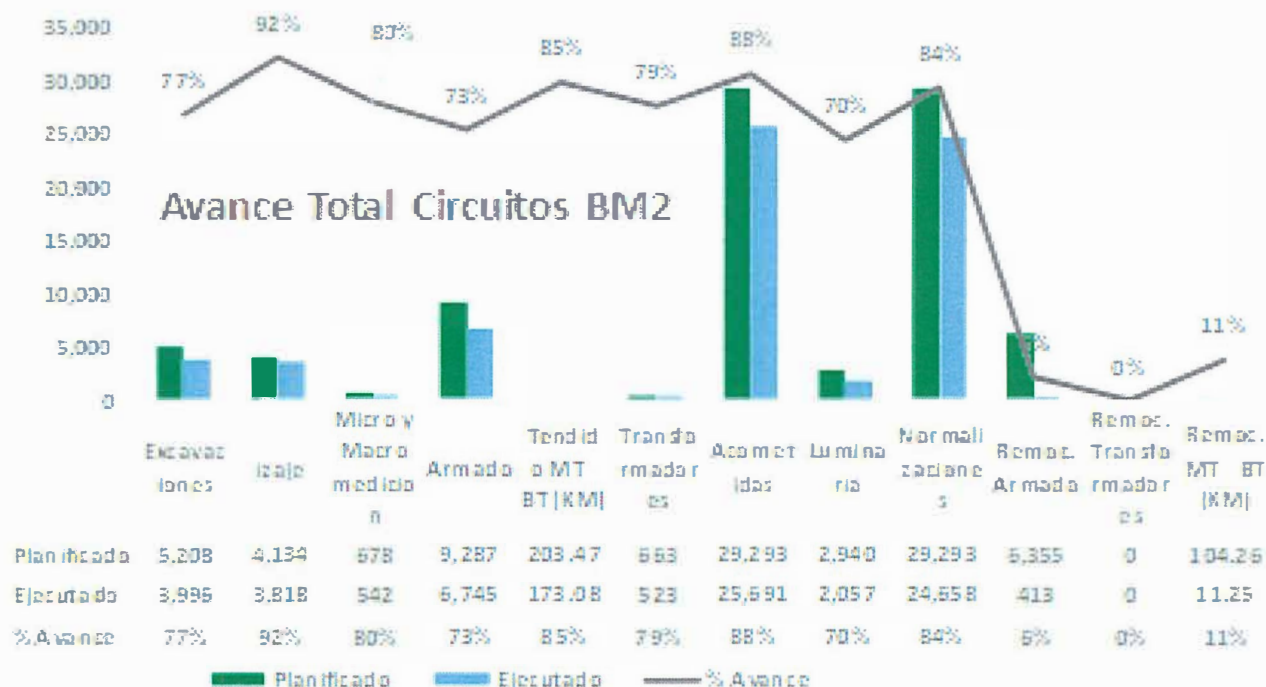


Avance del Proyecto Circuito HAM004

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

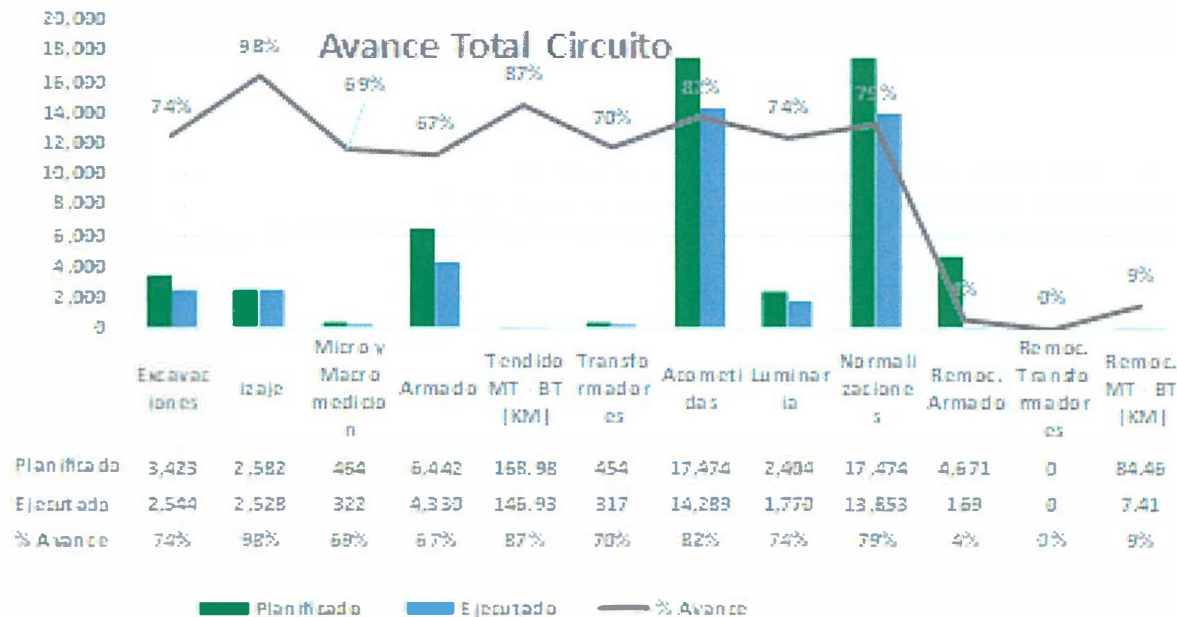

Avance del Proyecto Circuito TIM201

La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

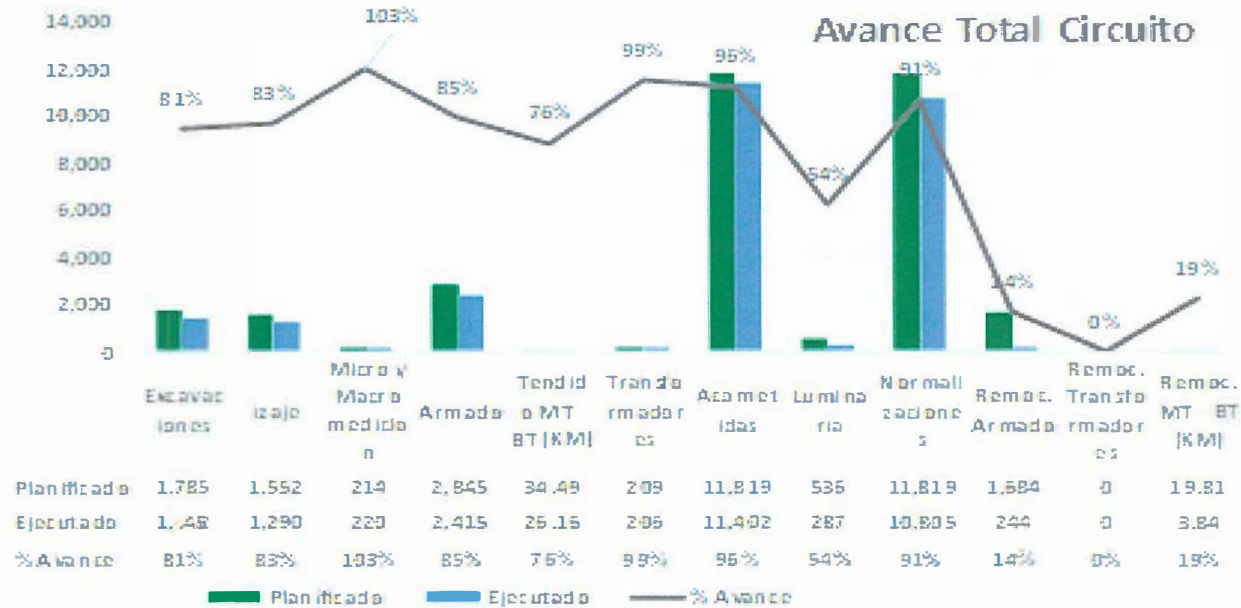

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen actividades al cierre del los proyectos.

MATRIZ PRE SENTACIÓN AVANCE S GESTIÓN SOCIAL						
GESTIÓN SOCIAL EDEESTE						
FINANCIAMIENTO BM						
Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad personas sensibilizadas		29,293	30,921	-	30,921	106%
Cantidad de personas capacitadas		11,242	8,647	-	8,647	77%
Cantidad adultos capacitados		3,295	2,304	-	2,304	70%
Cantidad de charlas comunitarias		55	64	-	64	116%
Total de niños en escuelas		6,507	6,290	-	6,290	97%
Cantidad de charlas en escuelas		128	74	-	74	58%
Cantidad de líderes capacitados		1,537	53	-	53	3%
Cantidad de talleres para líderes		62	3	-	3	5%
Cantidad de COSE formados		11	11	-	11	100%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		86	86	-	86	100%
Pactos Sociales		2	2	-	2	100%
Electricistas Comunitarios Formados		61	61	-	61	100%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		67	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		12,500	11,600	-	11,600	92%
Otras actividades importantes realizadas durante el periodo:						
No se reportaron actividades en estos circuitos.						



Ryan Morel Clase 2240
 Ryan Morel Clase Director de Proyectos
 Dirección de Proyectos



BANCO MUNDIAL
 BIRF • AIF





Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM

Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Mayo 2023

Avance Económico - Programas y Proyectos



A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

Avance Económico BM2

Costo Total	USD	16,198,705.43	100.0%
<i>Costo Total MA</i>	<i>USD</i>	<i>10,817,201.85</i>	<i>66.8%</i>
<i>Costo Total MO</i>	<i>USD</i>	<i>5,381,503.58</i>	<i>33.2%</i>
Monto Ejecutado	USD	15,799,944.11	97.5%
<i>Ejecutado MA</i>	<i>USD</i>	<i>10,465,515.47</i>	<i>96.7%</i>
<i>Ejecutado MO</i>	<i>USD</i>	<i>5,334,428.64</i>	<i>99.1%</i>
Monto Cubicado	USD	16,332,005.68	100.8%
<i>Cubicado MA</i>	<i>USD</i>	<i>10,977,356.79</i>	<i>101.5%</i>
<i>Cubicado MO</i>	<i>USD</i>	<i>5,354,648.89</i>	<i>99.5%</i>



**AVANCE
EJECUCIÓN
FINANC. BM2**



Ryan Morel Clase 2246
Ryan Morel Clase Director de Proyectos
Dirección de Proyectos



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF

