




Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Seguimiento de los Programas y Proyectos.

Mayo 2023

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de Redes




A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de Mayo 2023 correspondiente a la Licitación Pública Internacional No.LPI-BEI-01-2012 del Banco Europeo de Inversiones.

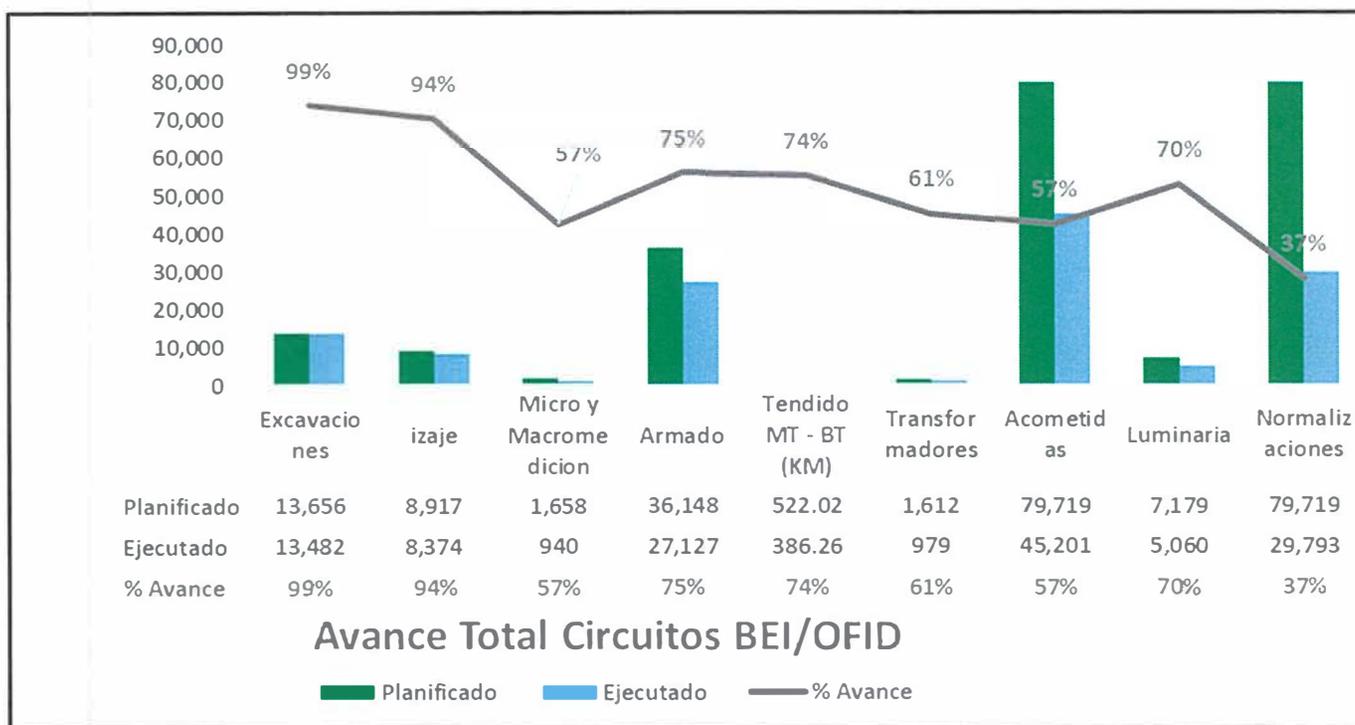


Avance del Proyecto Circuito CALE02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 10,730 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

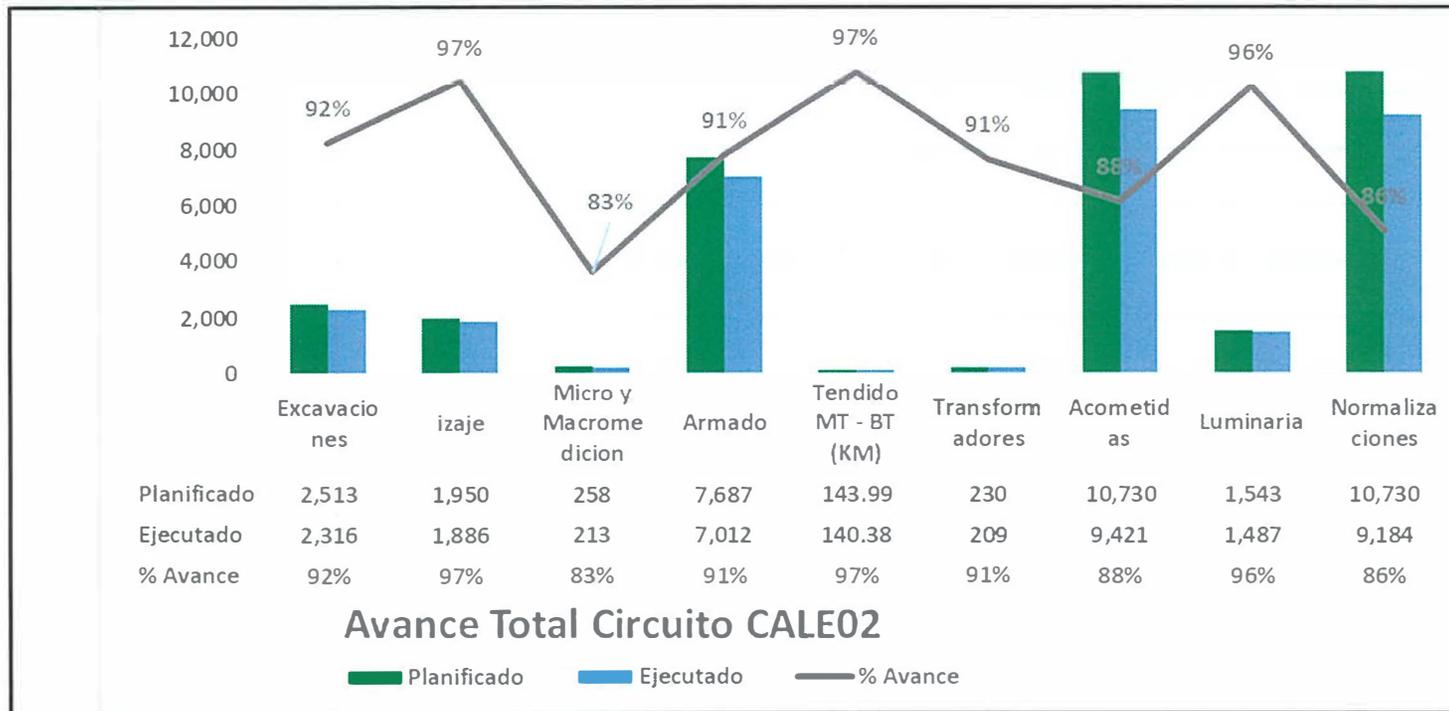


Avance del Proyecto Circuito GU6901

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 9,278 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

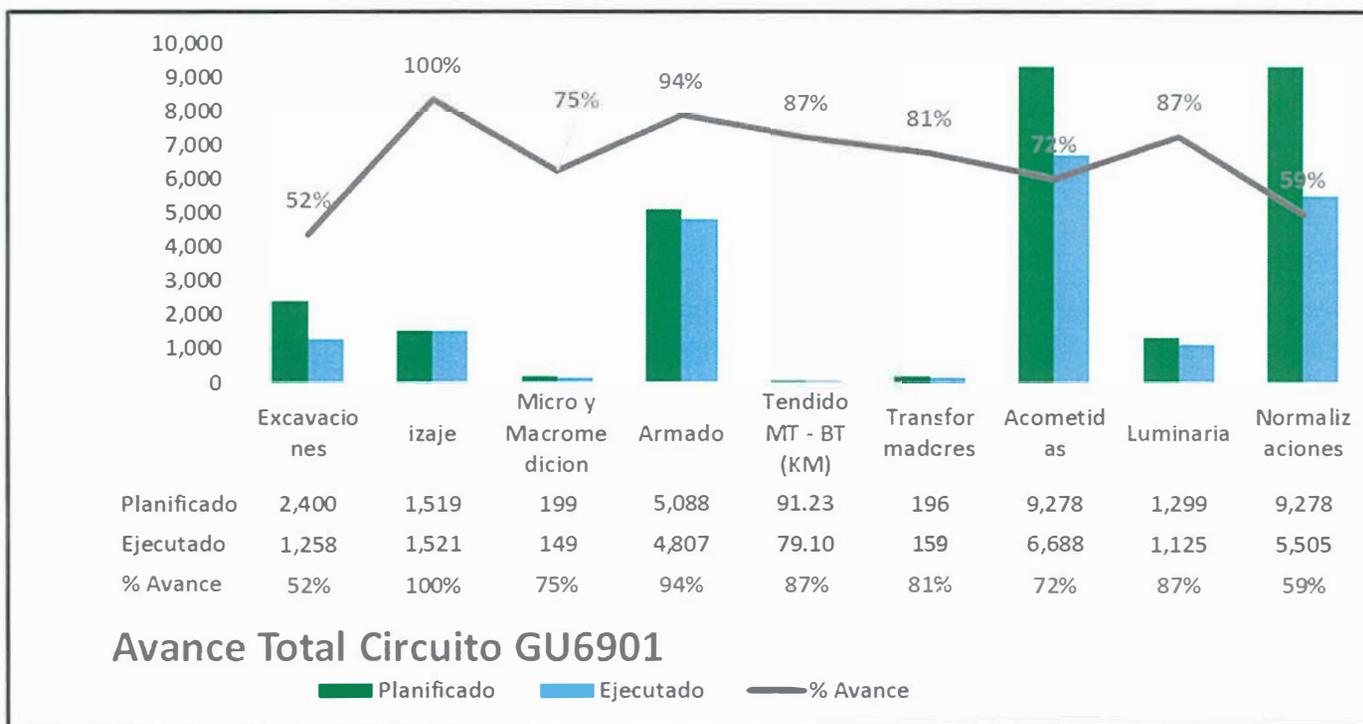


Avance del Proyecto Circuito SPER02

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 21,506 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

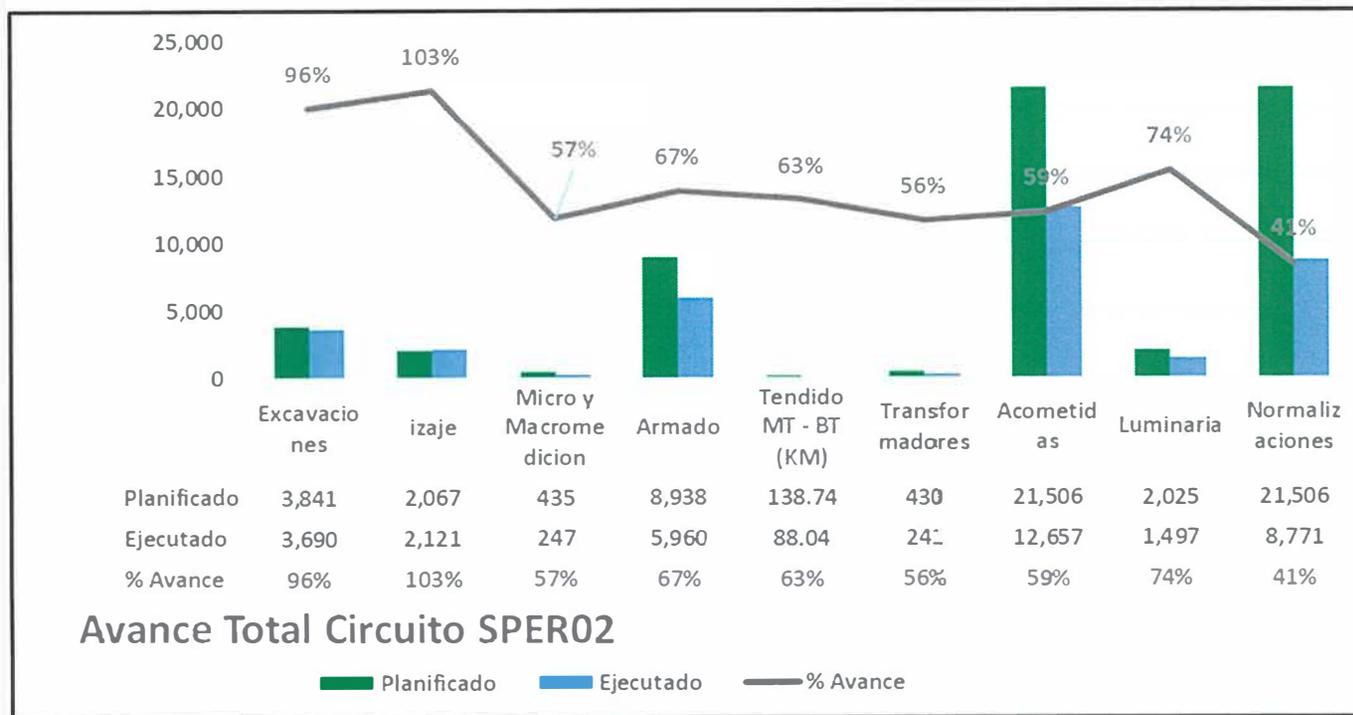


Avance del Proyecto Circuito VIME06

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 17,257 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

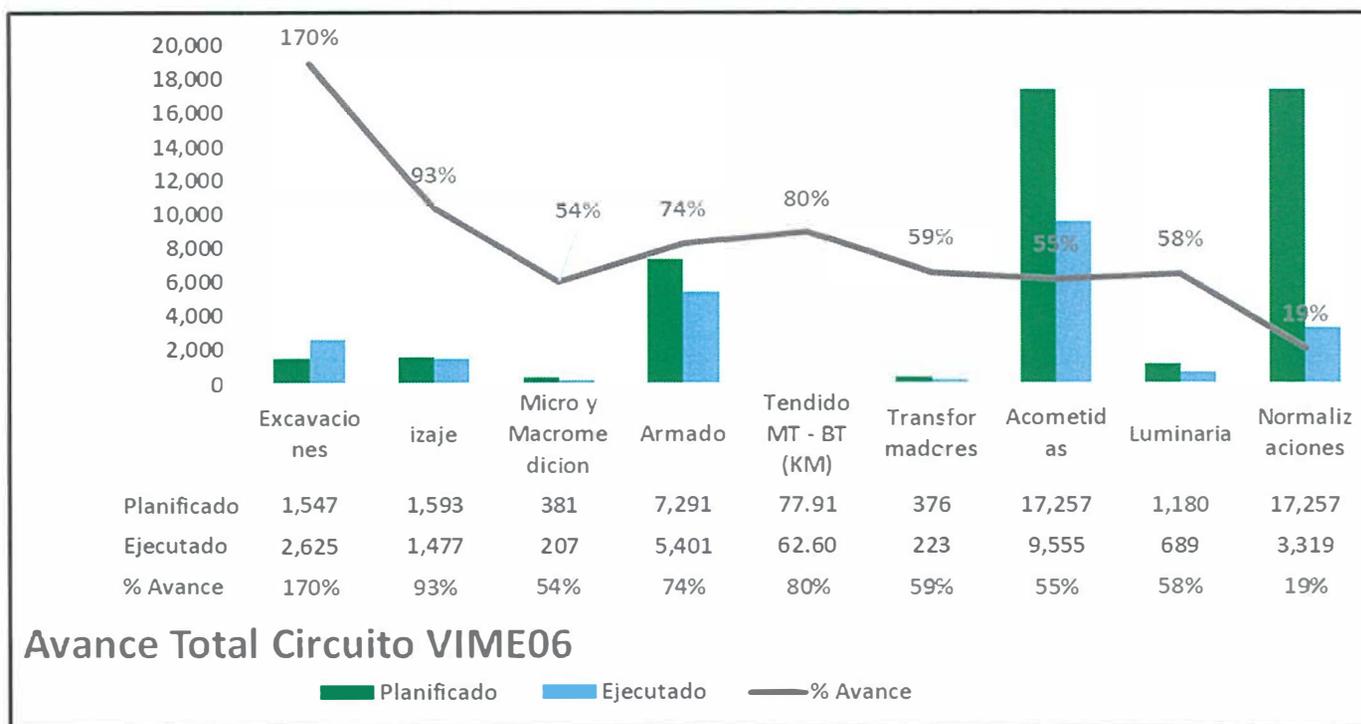

Avance del Proyecto Circuito LM6902

La grafica muestra el avance de las actividades previa para las 20,948 normalizaciones programadas a ejecutarse al finalizar el proyecto.

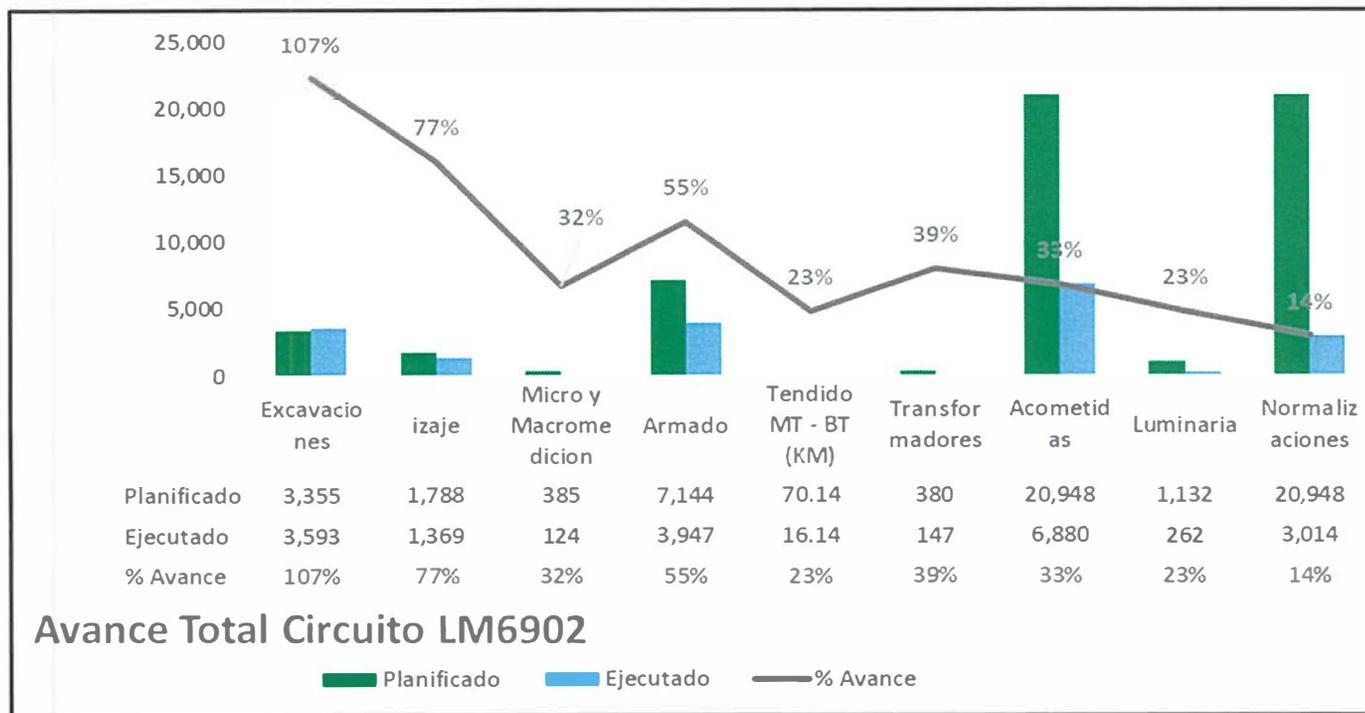

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico




GESTIÓN SOCIAL EDEESTE+A2:G27						
FINANCIAMIENTO OFID-III		Mayo		2023		
Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Mayo	79.719	85.045	42	85.087	107%
Cantidad de personas capacitadas		30.592	55.820	4.776	60.596	198%
Cantidad adultos Capacitados		8.968	32.316	2.762	35.078	391%
Cantidad de charlas comunitarias		148	544	3	547	370%
Total de niños/as capacitados		17.438	22.145	1.999	24.144	138%
Cantidad de Charlas en escuelas.		349	438	-	438	126%
Cantidad de líderes capacitados		4.185	1.359	15	1.374	33%
Cantidad de Talleres para Líderes		167	126	1	127	76%
Cantidad de COSE formados		38	39	-	39	103%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		283	289	-	289	102%
Pactos Sociales		5	-	-	-	0%
Electricistas Comunitarios Formados		156	6	-	6	4%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		125	70	-	70	56%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		18.750	11.050	-	11.050	59%

Otras actividades importantes realizadas durante el período:
 En este mes sensibilizamos a 1,117 personas mediante puerta a puerta y socializamos a 2,958. Asimismo, realizamos 18 capacitaciones a líderes con 308 participantes, 121 capacitaciones a la comunidad con 5,029 comunitarios. Posteriormente captamos 665 nuevos clientes, se reportaron 4 averías, fueron solucionadas 14, y se mitigaron 15 conflictos.

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social

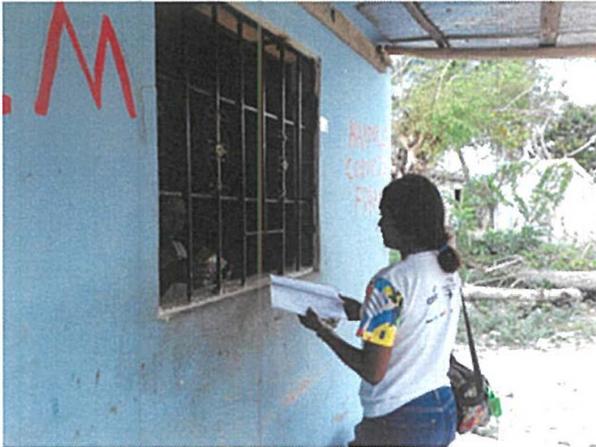

Identificación con clientes con deudas, CALE02



Identificación con clientes con alta facturación, CALE02



Reunión comunitaria, LM6902



Capacitación Puerta a puerta a niños y adultos, GU6901



Ryan Morel Clase x 2240
Ryan Morel Clase Director de Proyectos
Dirección de Proyectos



European
Investment
Bank



Resumen fotográfico gestión social



Socialización puerta a puerta SPER02



Reunión con líderes comunitarios en el SPER02



Reunión con el COSE VIME06



Reunión con COSE LM6902 con la participación del Gerente General, Dirección de proyectos y la UEP.



Visita a líderes, LM6902



Gestión de avería, LM6902



Ryan Morel Clase
Ryan Morel Clase Director de Proyectos
Dirección de Proyectos



European
Investment
Bank






Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BEI/OFID
Informe de Presupuesto de los Programas y Proyectos.

Mayo 2023

Avance Económico – Programas y Proyectos BEI

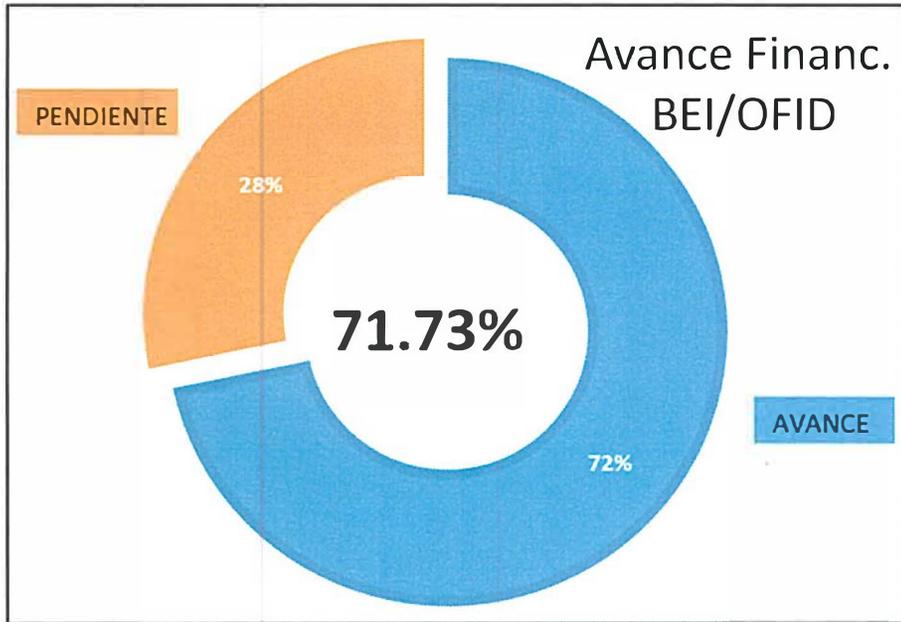

Avance Económico BEI/OFID

Categoría	Moneda	Monto	Porcentaje
Costo Total	USD	26,165,280.80	100.0%
Costo Total MA	USD	14,836,857.50	56.7%
Costo Total MO	USD	11,328,423.29	43.3%
Monto Ejecutado	USD	18,142,276.10	69.3%
Ejecutado MA	USD	10,599,280.98	71.4%
Ejecutado MO	USD	7,542,995.12	66.6%
Monto Restante	USD	8,023,004.70	30.7%
Restante MA	USD	4,237,576.52	28.6%
Restante MO	USD	3,785,428.18	33.4%
Monto Cubicado	USD	13,766,053.00	52.6%
Cubicado MA	USD	8,612,234.37	58.0%
Cubicado MO	USD	5,153,818.62	45.5%
Monto Disponible	USD	12,399,227.80	47.4%

Ryan Morel Clase, 2240
 Ryan Morel Clase Director de Proyectos
 Dirección de Proyectos



European Investment Bank

