



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM
Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos


Junio 2022

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes




Avance total de los Proyectos

A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de junio 2022 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.

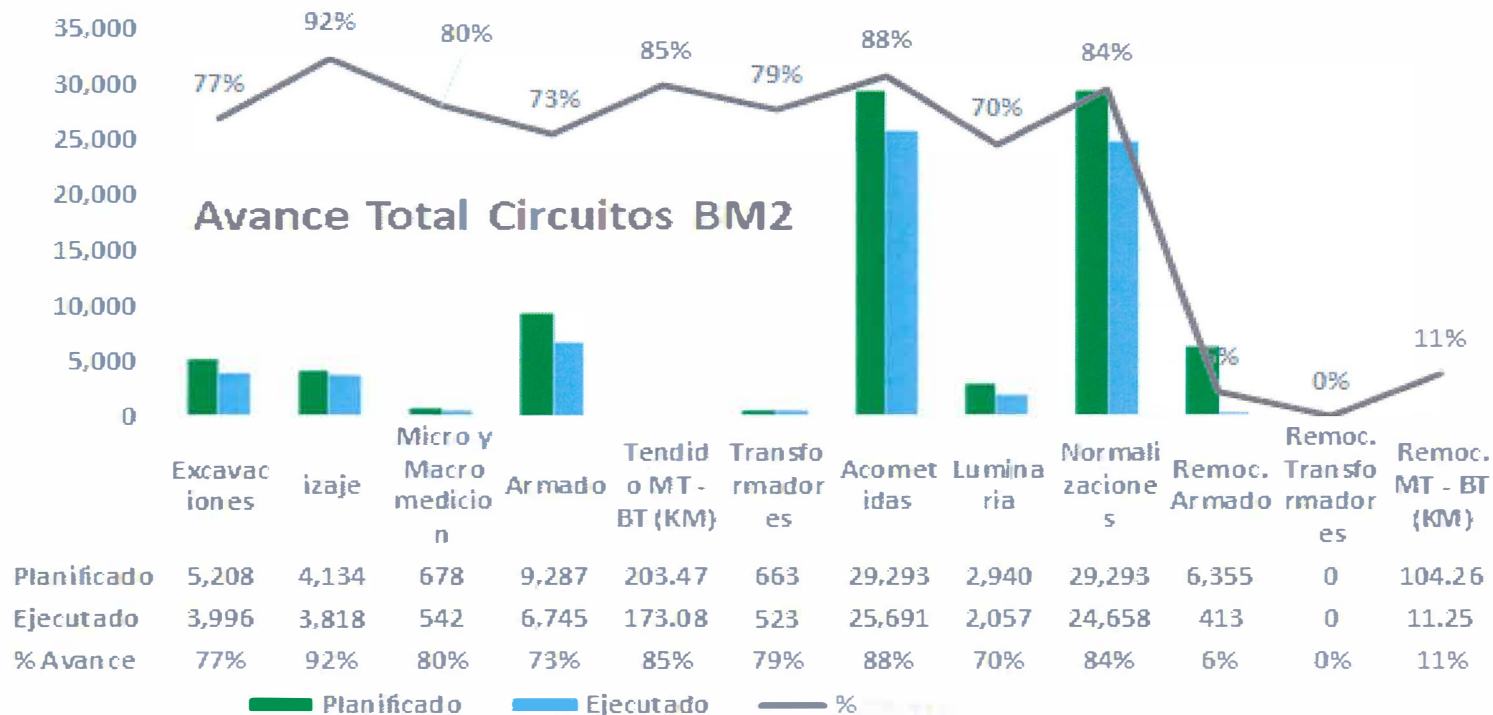


Avance del Proyecto Circuito HAMO04

La siguiente grafica muestra un avance de 79% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

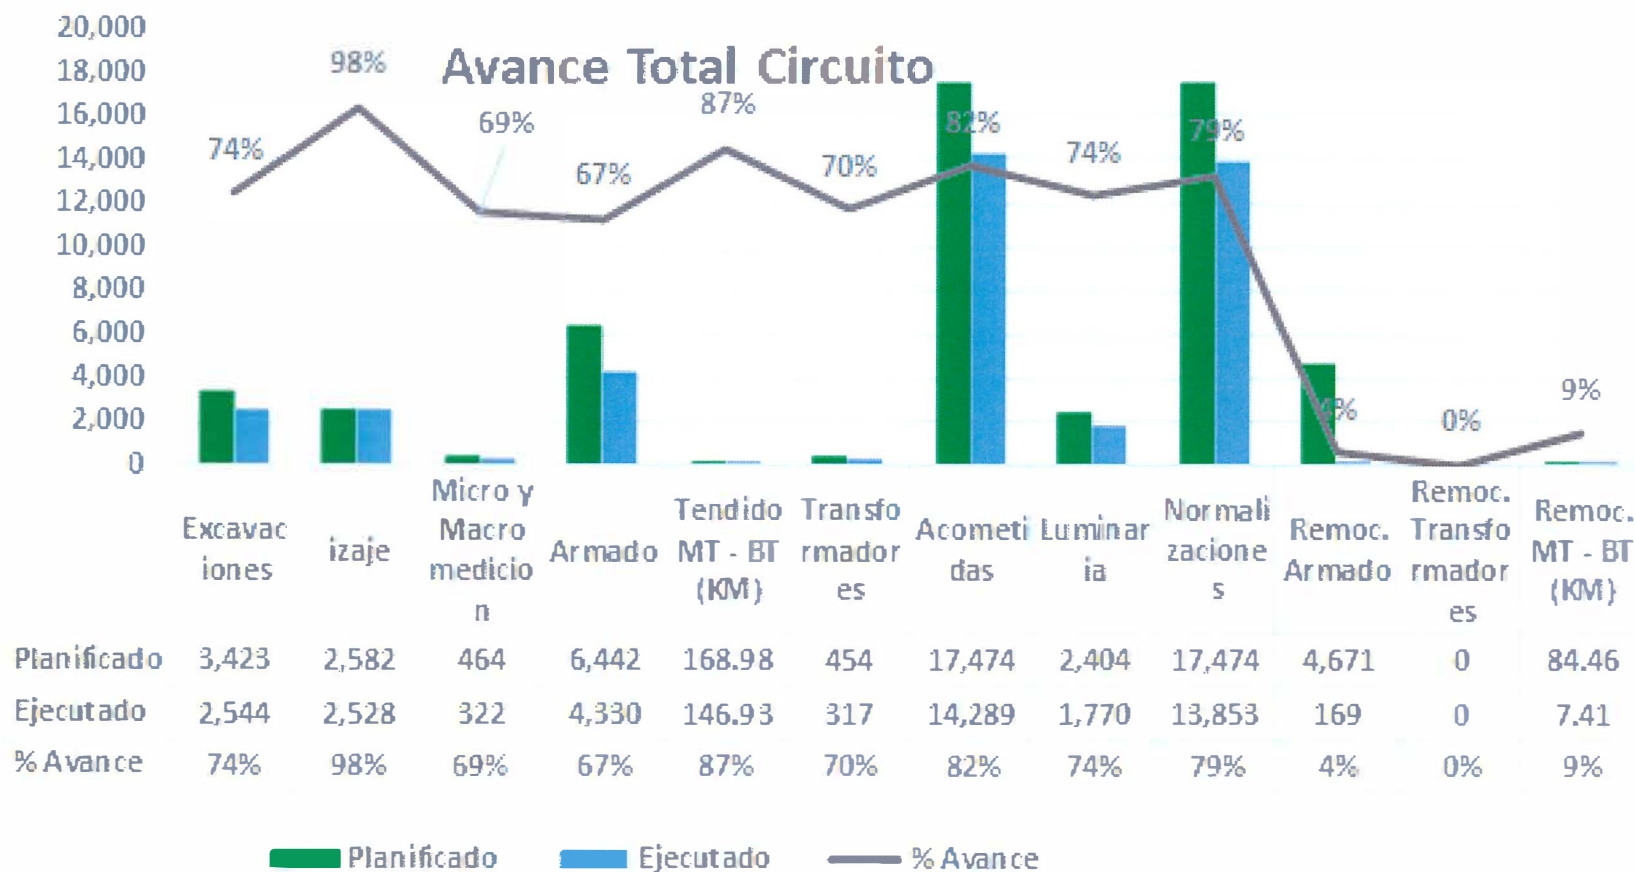

Avance del Proyecto Circuito TIM201

La siguiente grafica muestra un avance de 91% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.

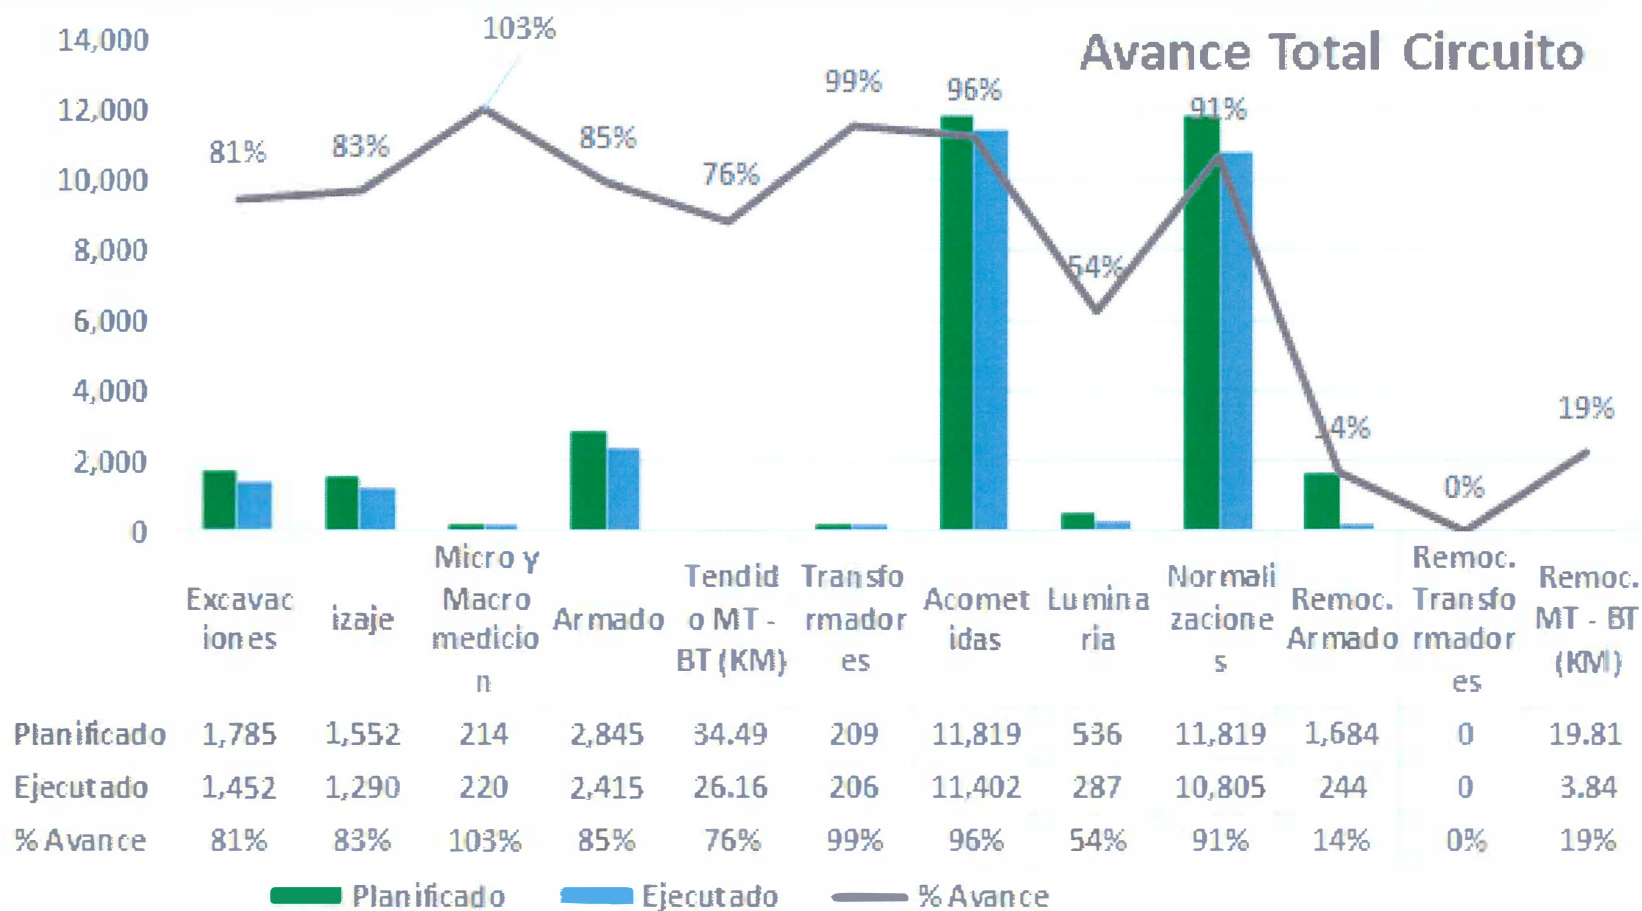

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen actividades al cierre del mes.

Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Junio	29,293	30,921	-	30,921	106%
Cantidad de personas capacitadas		11,242	8,555	11	8,566	76%
Cantidad adultos Capacitados		3,296	2,304	-	2,304	70%
Cantidad de charlas comunitarias		55	62	-	62	113%
Total de niño/as en escuelas		6,407	6,209	-	6,209	97%
Cantidad de Charlas en escuelas.		128	71	-	71	55%
Cantidad de líderes capacitados		1,537	42	11	53	3%
Cantidad de Talleres para Líderes		62	2	1	3	5%
Cantidad de COSE formados		11	11	-	11	100%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		86	86	-	86	100%
Pactos Sociales		2	2	-	2	100%
Electricistas Comunitarios Formados		61	61	-	61	100%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		67	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		11,600	11,600	-	11,600	100%

Otras actividades importantes realizadas durante el período:

Durante el mes se realizó 1 reunión con líderes donde acudieron 37 líderes, A si mismo 1 socialización puerta a puerta con una participación 107 ciudadanos, y se realizó 1 capacitación a líderes con 11 personas.

Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen fotográfico gestión social



Rendición de cuentas HAM004



Rendición de cuentas TIM201


Carlos Sanchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



European
Investment
Bank





Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM


Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Junio 2022

Avance Económico - Programas y Proyectos



A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

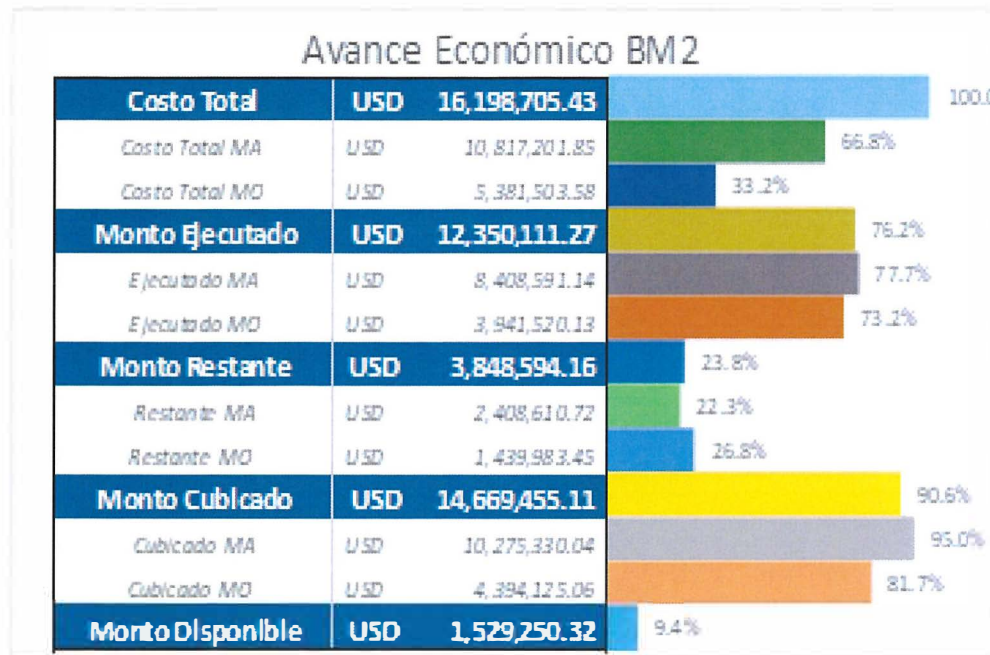

Carlos Sanchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
 Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas

